

くさび緊結式足場 (Style-A) 点検チェックリスト

点検実施日	年 月 日		
元方事業者			
工事名			
工区			
点検理由	<input type="checkbox"/> 悪天候後 <input type="checkbox"/> 地震後 <input type="checkbox"/> 組立後 <input type="checkbox"/> 一部解体後 <input type="checkbox"/> 変更後 <input type="checkbox"/> その他 (                      )		元請確認
点検者	会社名		氏名
	備考		


分類	点検項目	点検内容	判定	備考
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態	床付き布わく	① 変形、損傷又は腐食していないか	良 否	
		② つかみ金具の外れ止めは確実にロックしているか	良 否	
		③ 床付き布わく間の隙間は3cm以下か	良 否	
		④ 床付き布わくと建地の隙間は12cm未満か	良 否	
建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態	支柱	⑤ 連結部は確実にロックしているか	良 否	
	布材	⑥ くさびに緩みはないか	良 否	
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	緊結金具	⑦ クランプ等に変形、損傷又は腐食はないか	良 否	
	支柱	⑧ プレートに変形、損傷又は腐食はないか	良 否	
	布材	⑨ くさび緊結部に変形、損傷又は腐食はないか	良 否	
	先行手すり	⑩ くさび緊結部に変形、損傷又は腐食はないか	良 否	
足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無	布材	⑪ 手すり、中さん等は取り外していないか	良 否	
		⑫ 手すり、中さん等のくさびに緩みはないか	良 否	
		⑬ 手すりの高さは床材から85cm以上か	良 否	
		⑭ 中さんの高さは床材から35cm以上50cm以下か	良 否	
	先行手すり	⑮ 足場端部(裏面)に手すり、中さんを設置しているか	良 否	
		⑯ 取り外し又は脱落していないか	良 否	
		⑰ 上部金具は確実に設置しているか	良 否	
		⑱ くさびに緩みはないか	良 否	
幅木等の取付状態及び取り外しの有無	幅木、メッシュシート、防網等	⑲ 計画通りに設置し、取り外していないか	良 否	
		⑳ 確実に固定しているか	良 否	
脚部の沈下及び滑動の状態	地盤の状況	㉑ 地盤面は堅固で安定した状態か	良 否	
	ジャッキベース、敷板、敷角	㉒ 敷板、敷角に沈下、滑動はないか	良 否	
		㉓ ジャッキハンドルと支柱の間に隙間はないか	良 否	
	布材	㉔ ジャッキベースは敷板等に釘止めしているか	良 否	
筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無	筋かい、控え、壁つなぎ	㉕ 根がらみは直角2方向に設置しているか	良 否	
	壁つなぎ	㉖ 計画通りに設置し、取り外していないか	良 否	
建地、布及び腕木の損傷の有無	支柱、布材	㉗ 設置間隔は垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下か	良 否	
		㉘ 建物側、足場側とも堅固な部分に固定されているか	良 否	
		㉙ 変形、損傷又は腐食していないか	良 否	
		㉚ 支持部の支柱に壁つなぎを設置しているか	良 否	
開口部	梁枠等	㉛ 支持部の支柱に壁つなぎを設置しているか	良 否	
		㉜ 梁枠の外方に足場を1スパン以上設置しているか	良 否	
		㉝ 梁枠の外方1スパンの両構面に筋かい等を設置しているか	良 否	
		㉞ 梁枠の上方3層の両構面に先行手すりを設置しているか	良 否	
昇降設備	昇降階段、開口部手すり枠	㉟ 梁枠間の水平面に床付き布わくを設置しているか	良 否	
		㊱ 手すり、中さんを設置しているか	良 否	
その他	表示	㊲ 2層以下毎に踊り場を設置しているか	良 否	
		㊳ 最大積載荷重を表示しているか	良 否	
最終確認	支柱	㊴ 設置間隔は桁行方向1.85m以下、梁間方向1.5m以下か	良 否	
	計画図等	㊵ 計画通りに機材を組立てているか	良 否	

特記事項

## 点検時の注意ポイント (Style-A)


### 支柱

⑤ 連結部は確実にロックしているか




### 先行手すり

⑦ 上部金具は確実に設置しているか



### 布材


⑥ ⑫ 布材のくさびに緩みはないか



- ・リベットが金具より下側に出ていること
- ・手で触って緩みがないこと

### 先行手すり

⑧ 先行手すりのくさびに緩みはないか




- ・リベットが金具より下側に出ていること
- ・手で触って緩みがないこと

### 墜落防止設備

- ⑬ 手すりの高さは床材から85cm以上
- ⑭ 中さんの高さは床材から35cm以上50cm以下
- ⑮ 足場端部（妻面）に手すり、中さんを設置しているか

### 壁つなぎ

- ⑲ 壁つなぎの設置間隔：垂直方向5.0m以下
- ：水平方向5.5m以下

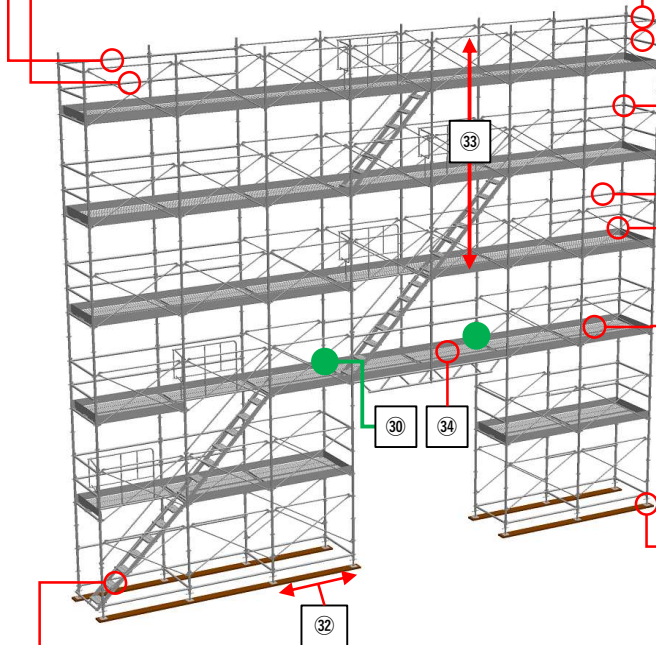


⑤ 支柱

⑥ ⑫ 布材

⑦ ⑧ 先行手すり

### 床付き布わく

⑳ つかみ金具の外れ止めは確実にロックしているか



### 脚部

- ㉑ 敷板、敷角に沈下、滑動はないか
- ㉒ ジャッキハンドルと支柱の間に隙間はないか

### 昇降設備

- ㉓ 昇降部及び開口部に手すり、中さんを設置しているか
- ㉔ 2層以下毎に踊り場を設置しているか

### 開口部

- ㉕ 梁柵支持部の支柱に壁つなぎを設置しているか
- ㉖ 梁柵の外方に足場を1スパン以上設置しているか
- ㉗ 梁柵の外方1スパンに筋かい等を設置しているか
- ㉘ 梁柵の上方3層の両構面に先行手すりを設置しているか
- ㉙ 梁柵間の水平面に床付き布わくを設置しているか
